

豊橋田原ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事について

1 建設予定地

豊橋市 資源化センター敷地内（豊橋市豊栄町字西530）
敷地面積（45,145.30㎡）

2 建設事業者

日鉄エンジニアリング・大林組・神野建設特定建設工事共同企業体

3 建設工事期間・工事工程表

1期工事：令和4（2022）年9月～令和10（2028）年3月
2期工事：令和10（2028）年4月～令和13（2031）年8月

工事項目／年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
	▼契約		1期工事				2期工事				▼竣工
準備・解体工事	■										
ごみ処理施設工事 （粗大ごみ処理設備を含む）			▼R6.2				▼R10.3				
管理棟工事							▼R10.4	▼R11.1			
解体工事(旧東工場棟)							▼R10.6		▼R12.5		
豊橋市単独施設工事										▼R12.6	▼R13.8

4 建設工事概要

- 1期工事：準備・解体（ごみ処理施設の建設に支障となる旧東工場棟の部分解体、旧管理棟・計量棟等の解体）
- ①ごみ処理施設建設
- 2期工事：②管理棟建設、旧東工場棟全解体
- ③豊橋市単独施設建設

5 施設規模・方式

417t/日（208.5t/日×2炉）
ガス化熔融炉（シャフト式）


6 用途

- ごみ焼却施設（一般廃棄物処理施設）
- ①ごみ処理施設（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ）
 - ②管理棟
 - ③豊橋市単独施設（家庭持込みごみ、危険ごみ、剪定枝）

7 構造・規模

構 造	①S、SRC、RC造 ②RC造 ③S造	延 べ 面 積	①15,930.00 ㎡ ②1,270.00 ㎡ ③2,870.00 ㎡
最 高 の 高 さ	①44.50 m ②15.70 m ③16.20 m	階 数	①地下1階、地上5階 ②地上3階 ③地上3階

8 完成イメージ図

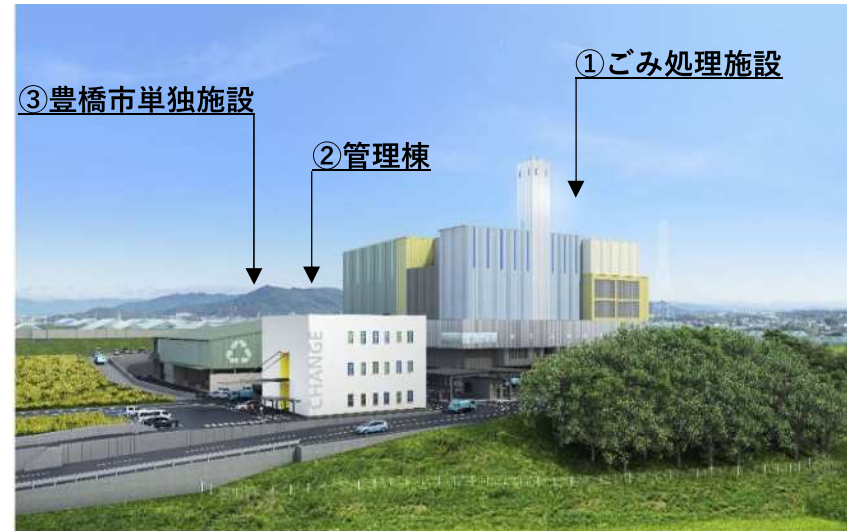

豊橋田原ごみ処理施設整備・運営事業建設工事の状況(令和5年10月現在)

